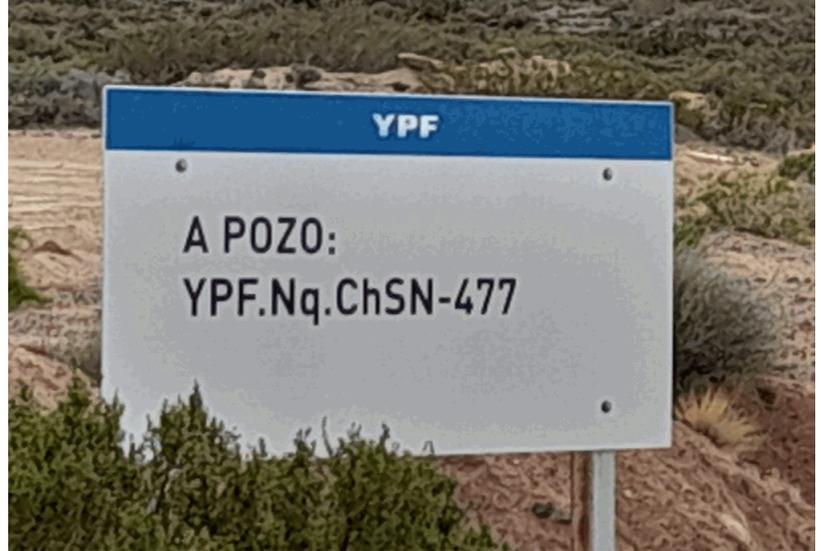


**INFORME DE VERIFICACIÓN DE ANCLAJES**

Cód: 274

Fecha de Emisión: 19/06/2022

ÁREA PRODUCCIÓN	Chihuido Sierra Negra
POZO	CHSN-477
LATITUD	
LONGITUD	
TENSIÓN MAX APLICADA	7.400,00
TENSIÓN DE REFERENCIA	SEGUN NORMA API RP 4G
ANCLAJES VERIFICAODOS	4
FECHA	18/06/2022
HORA	17:11:03
INTERNO	
PATRÓN	
MARCA	
MODELO	
Nº SERIE	
CERT CALIBRACIÓN	
FECHA VTO CAL	

**Personal Interviniente**

ANGELO, TOSI	MOYANO, MARCELO
--------------	-----------------



Firma Kompass s.r.l.

Firma Operario



Firma Kompass s.r.l.

Firma Operario



INFORME DE VERIFICACIÓN DE ANCLAJES

Cód: 274

Fecha de Emisión: 19/06/2022

Nº Anclaje	Orientación	Zona	Dist. Boca de Pozo	Long Inicial	Long Final	Resultado	Tipo
1	NO	D	27,00	25,00	35,00	Apto	PRUEBA



DEFECTOS

Deformaciones	N
Desgaste Localizado	N
Rotura Alma	N
Rotura Alambre	N
Corrosión	N

TERMINA OJAL

Emplomado	N
Encasquillado	S

TERRENO

Desnivel Pronunciado	N
Anclaje Inaccesible	N
Drenaje Fluidos	N

Observaciones:

HOMOLOGADO



ANTES



DESPUES



INFORME DE VERIFICACIÓN DE ANCLAJES

Cód: 274

Fecha de Emisión: 19/06/2022

Nº Anclaje	Orientación	Zona	Dist. Boca de Pozo	Long Inicial	Long Final	Resultado	Tipo
2	NE	D	27,00	25,00	35,00	Apto	PRUEBA



DEFECTOS

Deformaciones	N
Desgaste Localizado	N
Rotura Alma	N
Rotura Alambre	N
Corrosión	N

TERMINA OJAL

Emplomado	N
Encasquillado	S

TERRENO

Desnivel Pronunciado	N
Anclaje Inaccesible	N
Drenaje Fluidos	N

Observaciones:

HOMOLOGADO



ANTES



DESPUÉS



INFORME DE VERIFICACIÓN DE ANCLAJES

Cód: 274

Fecha de Emisión: 19/06/2022

Nº Anclaje	Orientación	Zona	Dist. Boca de Pozo	Long Inicial	Long Final	Resultado	Tipo
3	SE	D	27,00	25,00	35,00	Apto	PRUEBA



DEFECTOS

Deformaciones	N
Desgaste Localizado	N
Rotura Alma	N
Rotura Alambre	N
Corrosión	N

TERMINA OJAL

Emplomado	N
Encasquillado	S

TERRENO

Desnivel Pronunciado	N
Anclaje Inaccesible	N
Drenaje Fluidos	N

Observaciones:

HOMOLOGADO



ANTES



DESPUES



INFORME DE VERIFICACIÓN DE ANCLAJES

Cód: 274

Fecha de Emisión: 19/06/2022

Nº Anclaje	Orientación	Zona	Dist. Boca de Pozo	Long Inicial	Long Final	Resultado	Tipo
4	SO	D	27,00	25,00	35,00	Apto	PRUEBA



DEFECTOS

Deformaciones	N
Desgaste Localizado	N
Rotura Alma	N
Rotura Alambre	N
Corrosión	N

TERMINA OJAL

Emplomado	N
Encasquillado	S

TERRENO

Desnivel Pronunciado	N
Anclaje Inaccesible	N
Drenaje Fluidos	N

Observaciones:

HOMOLOGADO



ANTES



DESPUÉS
