

**INFORME DE VERIFICACIÓN DE ANCLAJES**

Cód: 121

Fecha de Emisión: 13/04/2022

ÁREA PRODUCCIÓN	CHUS
POZO	CHUS-38
LATITUD	
LONGITUD	
TENSIÓN MAX APLICADA	7.400,00
TENSIÓN DE REFERENCIA	SEGUN NORMA APIRP4G
ANCLAJES VERIFICAODOS	4
FECHA	13/04/2022
HORA	14:34:34
INTERNO	
PATRÓN	
MARCA	
MODELO	
Nº SERIE	
CERT CALIBRACIÓN	
FECHA VTO CAL	

**Personal Interviniente**

ESPINOLA, ALDO FEDERICO	MOYANO, MARCELO
-------------------------	-----------------

Firma Kompass s.r.l.

Firma Kompass s.r.l.

Firma Operario

Firma Operario



**INFORME DE VERIFICACIÓN DE ANCLAJES**

Cód: 121

Fecha de Emisión: 13/04/2022

Nº Anclaje	Orientación	Zona	Dist. Boca de Pozo	Long Inicial	Long Final	Resultado	Tipo
1	NO	D	27,00	25,00	35,00	Apto	PRUEBA



**DEFECTOS**

Deformaciones	S
Desgaste Localizado	S
Rotura Alma	N
Rotura Alambre	N
Corrosión	S

**TERMINA OJAL**

Emplomado	N
Encasquillado	N

**TERRENO**

Desnivel Pronunciado	N
Anclaje Inaccesible	N
Drenaje Fluidos	N

**Observaciones:**

NO HOMOLOGADO



ANTES



DESPUES



**INFORME DE VERIFICACIÓN DE ANCLAJES**

Cód: 121

Fecha de Emisión: 13/04/2022

Nº Anclaje	Orientación	Zona	Dist. Boca de Pozo	Long Inicial	Long Final	Resultado	Tipo
2	NE	D	27,00	25,00	35,00	Apto	PRUEBA



**DEFECTOS**

Deformaciones	N
Desgaste Localizado	S
Rotura Alma	N
Rotura Alambre	N
Corrosión	S

**TERMINA OJAL**

Emplomado	N
Encasquillado	N

**TERRENO**

Desnivel Pronunciado	N
Anclaje Inaccesible	N
Drenaje Fluidos	N

**Observaciones:**

NO HOMOLOGADO



ANTES



DESPUES



**INFORME DE VERIFICACIÓN DE ANCLAJES**

Cód: 121

Fecha de Emisión: 13/04/2022

Nº Anclaje	Orientación	Zona	Dist. Boca de Pozo	Long Inicial	Long Final	Resultado	Tipo
3	SE	D	27,00	25,00	35,00	Apto	PRUEBA



**DEFECTOS**

Deformaciones	N
Desgaste Localizado	N
Rotura Alma	N
Rotura Alambre	N
Corrosión	N

**TERMINA OJAL**

Emplomado	N
Encasquillado	S

**TERRENO**

Desnivel Pronunciado	N
Anclaje Inaccesible	N
Drenaje Fluidos	N

**Observaciones:**

HOMOLOGADO



ANTES



DESPUES




**INFORME DE VERIFICACIÓN DE ANCLAJES**

Cód: 121

Fecha de Emisión: 13/04/2022

Nº Anclaje	Orientación	Zona	Dist. Boca de Pozo	Long Inicial	Long Final	Resultado	Tipo
4	SO	D	27,00	25,00	35,00	Apto	PRUEBA

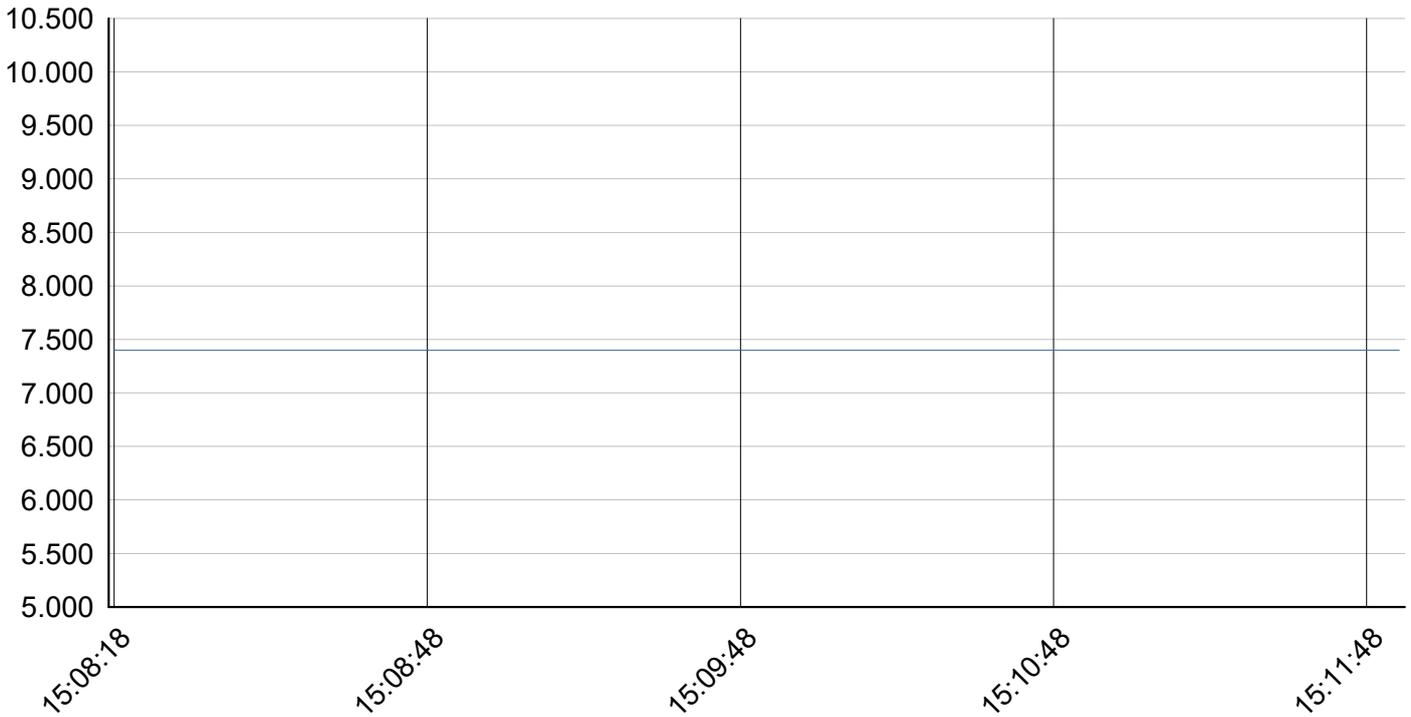

**DEFECTOS**

Deformaciones	N
Desgaste Localizado	N
Rotura Alma	N
Rotura Alambre	N
Corrosión	N

**TERMINA OJAL**

Emplomado	N
Encasquillado	S

**TERRENO**

Desnivel Pronunciado	N
Anclaje Inaccesible	N
Drenaje Fluidos	N

**Observaciones:**

HOMOLOGADO



ANTES



DESPUES
