

**INFORME DE VERIFICACIÓN DE ANCLAJES**

Cód: 129

Fecha de Emisión: 17/04/2022

| | |
|-----------------------|------------------------|
| ÁREA PRODUCCIÓN | ZONA VARIAS |
| POZO | CN-4 |
| LATITUD | |
| LONGITUD | |
| TENSIÓN MAX APLICADA | 7.400,00 |
| TENSIÓN DE REFERENCIA | SEGUN NORMAS API RP 4G |
| ANCLAJES VERIFICAODOS | 5 |
| FECHA | 17/04/2022 |
| HORA | 11:25:23 |
| INTERNO | |
| PATRÓN | |
| MARCA | |
| MODELO | |
| Nº SERIE | |
| CERT CALIBRACIÓN | |
| FECHA VTO CAL | |

**Personal Interviniente**

| | |
|-----------------|--------------|
| MOYANO, MARCELO | ANGELO, TOSI |
|-----------------|--------------|



Firma Kompass s.r.l.



Firma Kompass s.r.l.

Firma Operario

Firma Operario




INFORME DE VERIFICACIÓN DE ANCLAJES

Cód: 129

Fecha de Emisión: 17/04/2022

| Nº Anclaje | Orientación | Zona | Dist. Boca de Pozo | Long Inicial | Long Final | Resultado | Tipo |
|------------|-------------|------|--------------------|--------------|------------|-----------|--------|
| 1 | NO | D | 27,00 | 25,00 | 35,00 | Apto | PRUEBA |

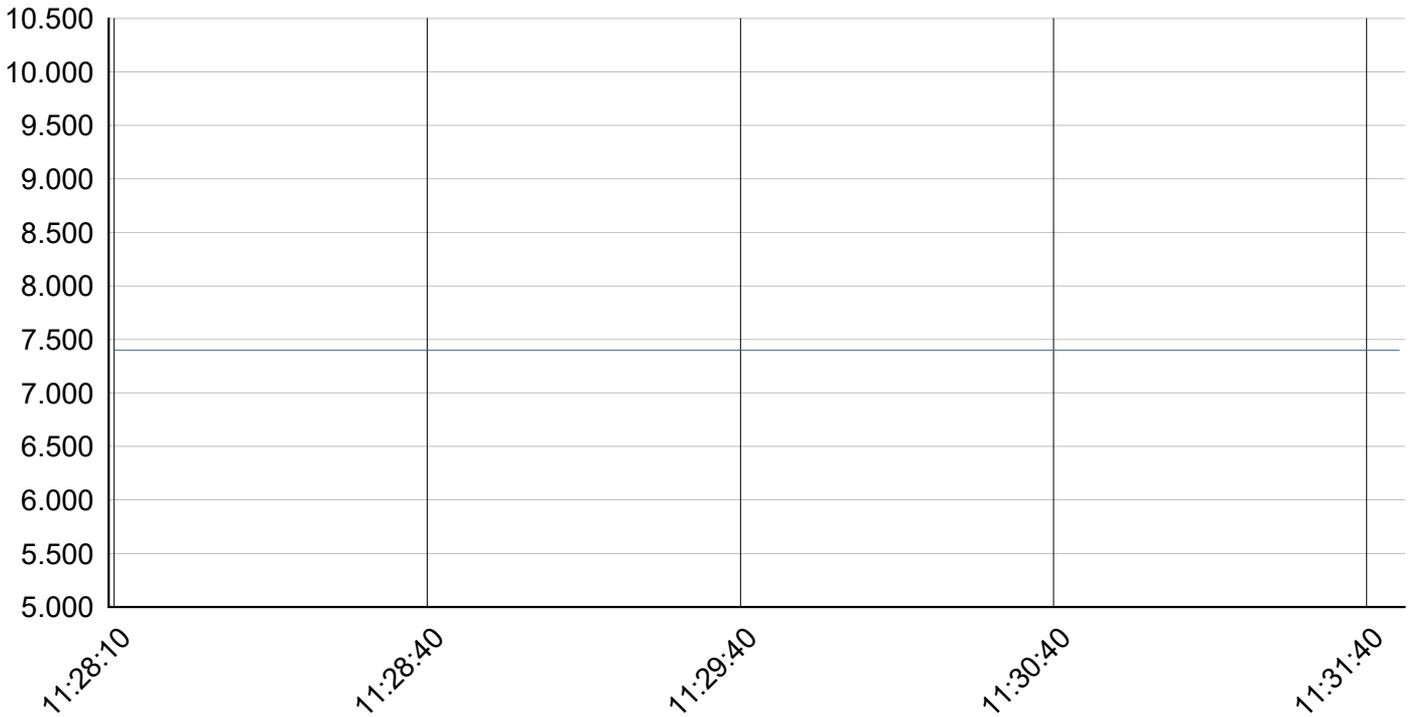

DEFECTOS

| | |
|---------------------|---|
| Deformaciones | N |
| Desgaste Localizado | N |
| Rotura Alma | N |
| Rotura Alambre | N |
| Corrosión | S |

TERMINA OJAL

| | |
|---------------|---|
| Emplomado | N |
| Encasquillado | N |

TERRENO

| | |
|----------------------|---|
| Desnivel Pronunciado | N |
| Anclaje Inaccesible | N |
| Drenaje Fluidos | N |

Observaciones:

NO HOMOLOGADO



ANTES



DESPUES



INFORME DE VERIFICACIÓN DE ANCLAJES

Cód: 129

Fecha de Emisión: 17/04/2022

| Nº Anclaje | Orientación | Zona | Dist. Boca de Pozo | Long Inicial | Long Final | Resultado | Tipo |
|------------|-------------|------|--------------------|--------------|------------|-----------|--------|
| 2 | NE | D | 27,00 | 25,00 | 35,00 | Apto | PRUEBA |



DEFECTOS

| | |
|---------------------|---|
| Deformaciones | N |
| Desgaste Localizado | N |
| Rotura Alma | N |
| Rotura Alambre | N |
| Corrosión | S |

TERMINA OJAL

| | |
|---------------|---|
| Emplomado | N |
| Encasquillado | N |

TERRENO

| | |
|----------------------|---|
| Desnivel Pronunciado | N |
| Anclaje Inaccesible | N |
| Drenaje Fluidos | N |

Observaciones:

NO HOMOLOGADO



ANTES



DESPUES



INFORME DE VERIFICACIÓN DE ANCLAJES

Cód: 129

Fecha de Emisión: 17/04/2022

| Nº Anclaje | Orientación | Zona | Dist. Boca de Pozo | Long Inicial | Long Final | Resultado | Tipo |
|------------|-------------|------|--------------------|--------------|------------|-----------|--------|
| 3 | SE | D | 27,00 | 25,00 | 35,00 | Apto | PRUEBA |



DEFECTOS

| | |
|---------------------|---|
| Deformaciones | N |
| Desgaste Localizado | N |
| Rotura Alma | N |
| Rotura Alambre | N |
| Corrosión | S |

TERMINA OJAL

| | |
|---------------|---|
| Emplomado | N |
| Encasquillado | N |

TERRENO

| | |
|----------------------|---|
| Desnivel Pronunciado | N |
| Anclaje Inaccesible | N |
| Drenaje Fluidos | N |

Observaciones:

NO HOMOLOGADO



ANTES



DESPUES



INFORME DE VERIFICACIÓN DE ANCLAJES

Cód: 129

Fecha de Emisión: 17/04/2022

| Nº Anclaje | Orientación | Zona | Dist. Boca de Pozo | Long Inicial | Long Final | Resultado | Tipo |
|------------|-------------|------|--------------------|--------------|------------|-----------|--------|
| 4 | SO | D | 27,00 | 25,00 | 35,00 | Apto | PRUEBA |



DEFECTOS

| | |
|---------------------|---|
| Deformaciones | N |
| Desgaste Localizado | N |
| Rotura Alma | N |
| Rotura Alambre | N |
| Corrosión | N |

TERMINA OJAL

| | |
|---------------|---|
| Emplomado | N |
| Encasquillado | S |

TERRENO

| | |
|----------------------|---|
| Desnivel Pronunciado | N |
| Anclaje Inaccesible | N |
| Drenaje Fluidos | N |

Observaciones:

HOMPLOGADO



ANTES



DESPUES



INFORME DE VERIFICACIÓN DE ANCLAJES

Cód: 129

Fecha de Emisión: 17/04/2022

| Nº Anclaje | Orientación | Zona | Dist. Boca de Pozo | Long Inicial | Long Final | Resultado | Tipo |
|------------|-------------|------|--------------------|--------------|------------|-----------|--------|
| 5 | S | D | 27,00 | 25,00 | 35,00 | Apto | PRUEBA |



DEFECTOS

| | |
|---------------------|---|
| Deformaciones | N |
| Desgaste Localizado | N |
| Rotura Alma | N |
| Rotura Alambre | N |
| Corrosión | N |

TERMINA OJAL

| | |
|---------------|---|
| Emplomado | N |
| Encasquillado | S |

TERRENO

| | |
|----------------------|---|
| Desnivel Pronunciado | N |
| Anclaje Inaccesible | N |
| Drenaje Fluidos | N |

Observaciones:

HOMOLOGADO



ANTES



DESPUES
