

**INFORME DE VERIFICACIÓN DE ANCLAJES**

Cód: 121

Fecha de Emisión: 22/07/2022

ÁREA PRODUCCIÓN	Lomita
POZO	LMS-B30
LATITUD	
LONGITUD	
TENSIÓN MAX APLICADA	7.400,00
TENSIÓN DE REFERENCIA	API 4 G
ANCLAJES VERIFICADOS	4
FECHA	22/07/2022
HORA	16:37:49
INTERNO	
PATRÓN	
MARCA	IVECO
MODELO	DAILY 70C16
Nº SERIE	
CERT CALIBRACIÓN	
FECHA VTO CAL	

**Personal Interviniente**

MOYANO, MARCELO	ESPINOLA, ALDO FEDERICO
-----------------	-------------------------

Firma Kompass s.r.l.

Firma Operario

Firma Kompass s.r.l.

Firma Operario




INFORME DE VERIFICACIÓN DE ANCLAJES

Cód: 121

Fecha de Emisión: 22/07/2022

Nº Anclaje	Orientación	Zona	Dist. Boca de Pozo	Long Inicial	Long Final	Resultado	Tipo
1	NO	D	27,00	25,00	35,00	Apto	PRUEBA

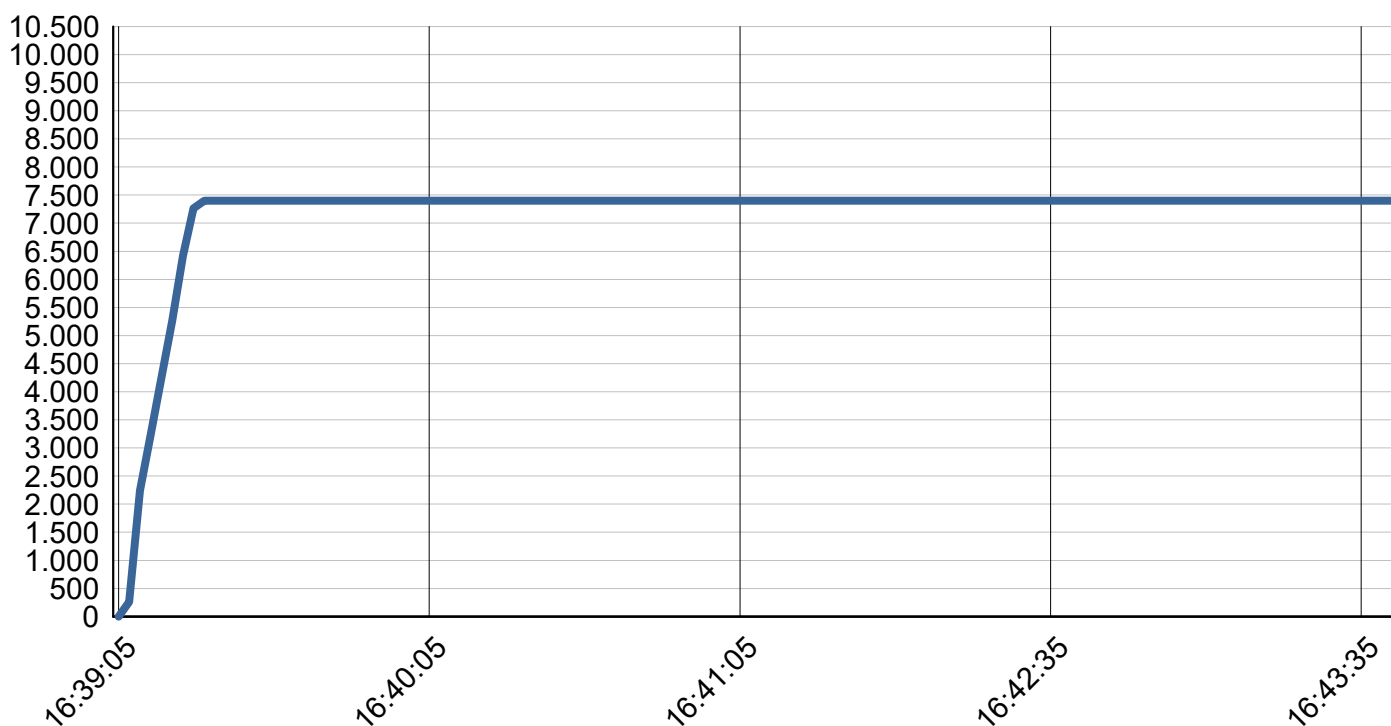

DEFECTOS

Deformaciones	N
Desgaste Localizado	N
Rotura Alma	N
Rotura Alambre	N
Corrosión	N

TERMINA OJAL

Emplomado	N
Encasquillado	S

TERRENO

Desnivel Pronunciado	N
Anclaje Inaccesible	N
Drenaje Fluidos	N

Observaciones:

HOMOLOGADO



ANTES



DESPUÉS




INFORME DE VERIFICACIÓN DE ANCLAJES

Cód: 121

Fecha de Emisión: 22/07/2022

Nº Anclaje	Orientación	Zona	Dist. Boca de Pozo	Long Inicial	Long Final	Resultado	Tipo
2	NE	D	27,00	25,00	35,00	Apto	PRUEBA

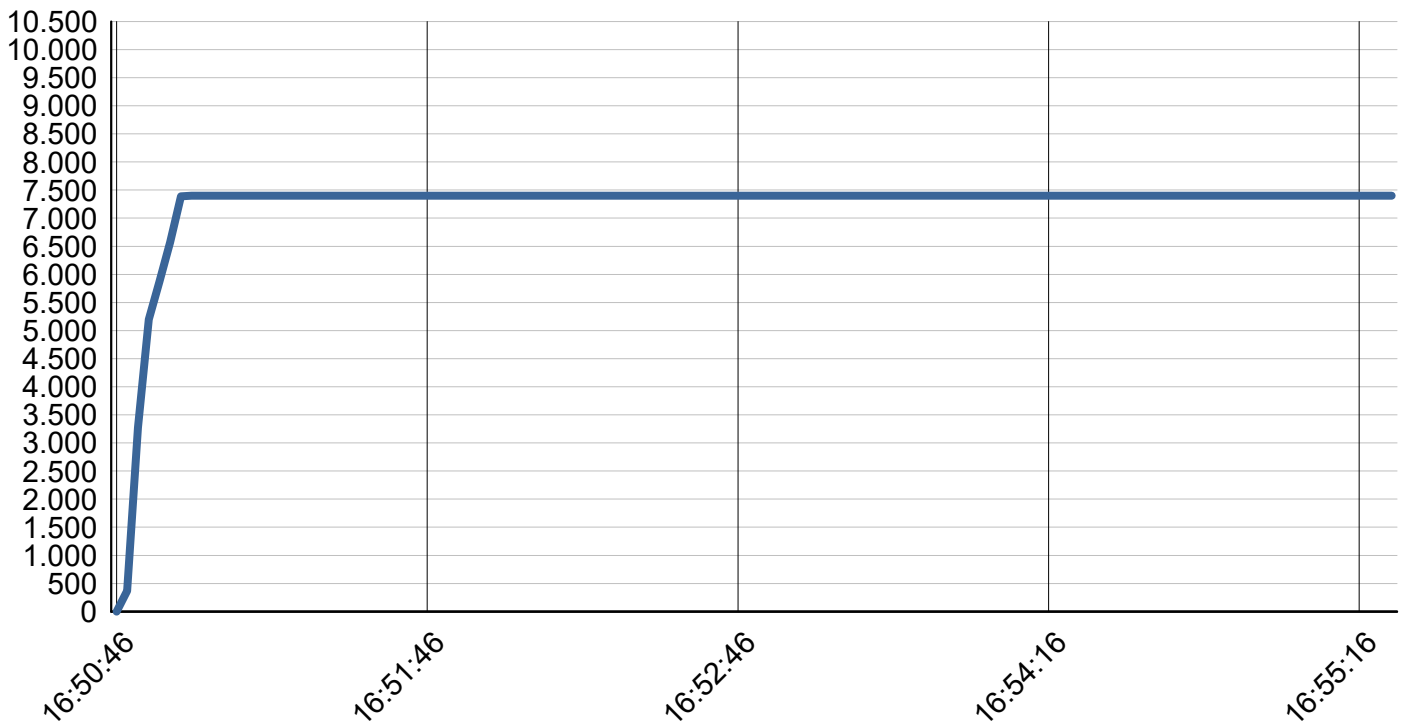

DEFECTOS

Deformaciones	N
Desgaste Localizado	N
Rotura Alma	N
Rotura Alambre	N
Corrosión	N

TERMINA OJAL

Emplomado	N
Encasquillado	S

TERRENO

Desnivel Pronunciado	N
Anclaje Inaccesible	N
Drenaje Fluidos	N

Observaciones:

HOMOLOGADO



ANTES



DESPUÉS




INFORME DE VERIFICACIÓN DE ANCLAJES

Cód: 121

Fecha de Emisión: 22/07/2022

Nº Anclaje	Orientación	Zona	Dist. Boca de Pozo	Long Inicial	Long Final	Resultado	Tipo
3	SE	D	27,00	25,00	35,00	Apto	PRUEBA

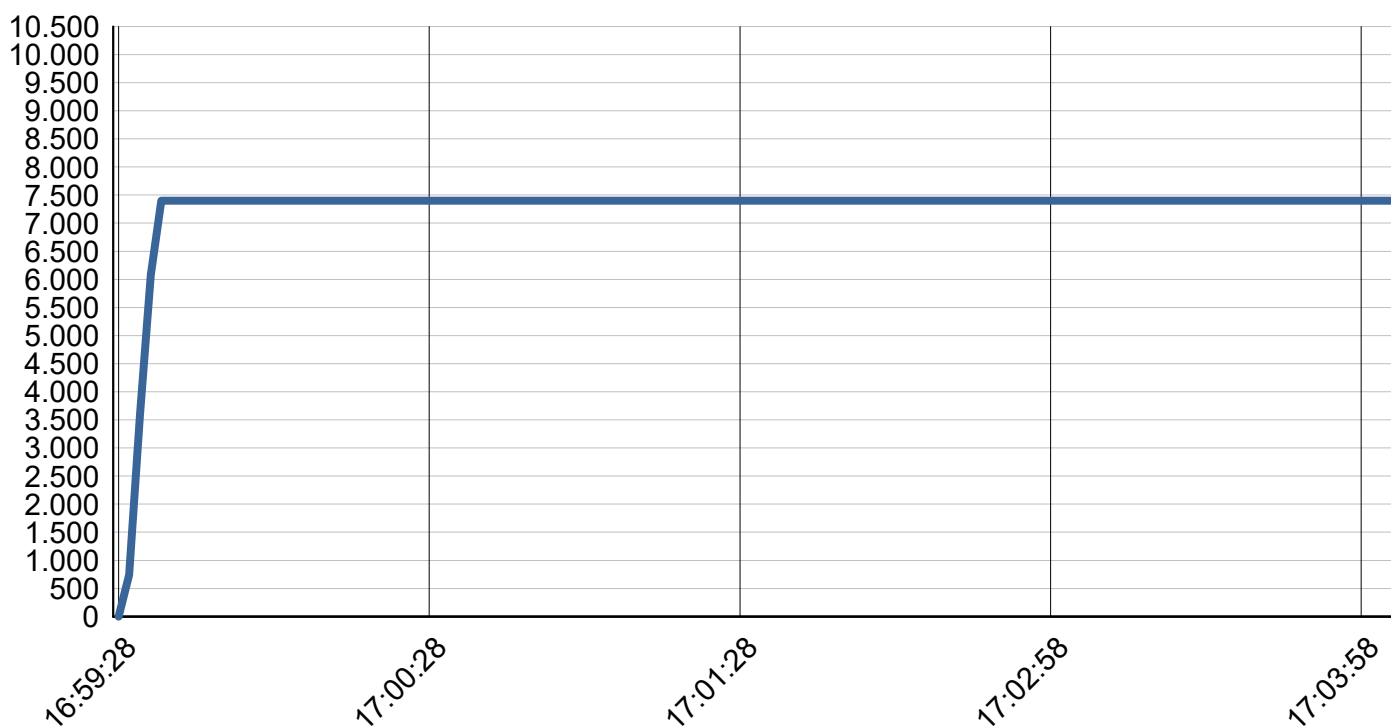

DEFECTOS

Deformaciones	N
Desgaste Localizado	N
Rotura Alma	N
Rotura Alambre	N
Corrosión	N

TERMINA OJAL

Emplomado	N
Encasquillado	S

TERRENO

Desnivel Pronunciado	N
Anclaje Inaccesible	N
Drenaje Fluidos	N

Observaciones:

HOMOLOGADO



ANTES



DESPUÉS




INFORME DE VERIFICACIÓN DE ANCLAJES

Cód: 121

Fecha de Emisión: 22/07/2022

Nº Anclaje	Orientación	Zona	Dist. Boca de Pozo	Long Inicial	Long Final	Resultado	Tipo
4	SO	D	27,00	25,00	35,00	Apto	PRUEBA

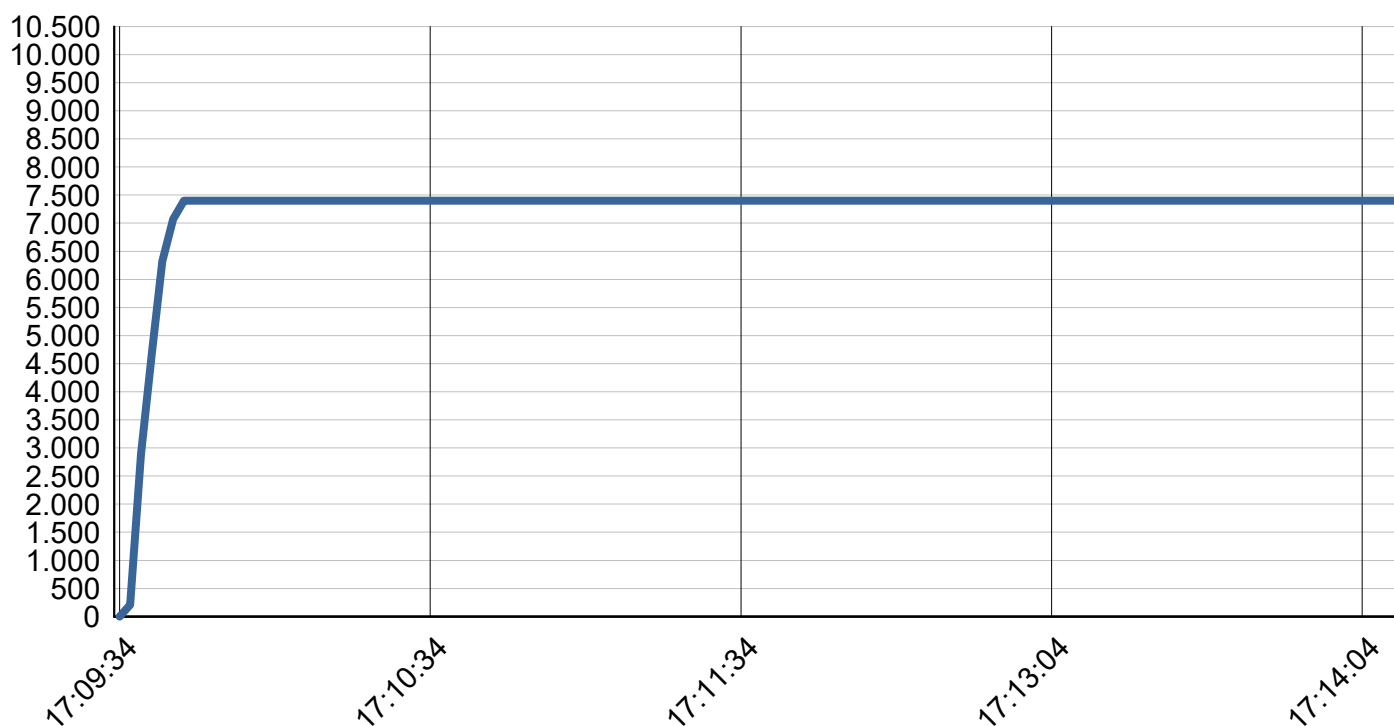

DEFECTOS

Deformaciones	N
Desgaste Localizado	N
Rotura Alma	N
Rotura Alambre	N
Corrosión	N

TERMINA OJAL

Emplomado	N
Encasquillado	S

TERRENO

Desnivel Pronunciado	N
Anclaje Inaccesible	N
Drenaje Fluidos	N

Observaciones:

HOMOLOGADO



ANTES



DESPUÉS
