



INFORME DE VERIFICACIÓN DE ANCLAJES

Cód: 65

Fecha de Emisión: 30/06/2022

ÁREA PRODUCCIÓN	Puesto Hernández
POZO	PH-94
LATITUD	
LONGITUD	
TENSIÓN MAX APLICADA	7.400,00
TENSIÓN DE REFERENCIA	API 4 G
ANCLAJES VERIFICAODOS	5
FECHA	30/06/2022
HORA	15:22:49
INTERNO	
PATRÓN	
MARCA	IVECO
MODELO	DAILY 70C16
Nº SERIE	
CERT CALIBRACIÓN	
FECHA VTO CAL	



**Personal Interviniente**

MOYANO, MARCELO	ESPINOLA, ALDO FEDERICO
-----------------	-------------------------

--	--

Firma Operario

Firma Operario




**INFORME DE VERIFICACIÓN DE ANCLAJES**

Cód: 65

Fecha de Emisión: 30/06/2022

Nº Anclaje	Orientación	Zona	Dist. Boca de Pozo	Long Inicial	Long Final	Resultado	Tipo
1	NO	D	270,00	25,00	350,00	Apto	PRUEBA

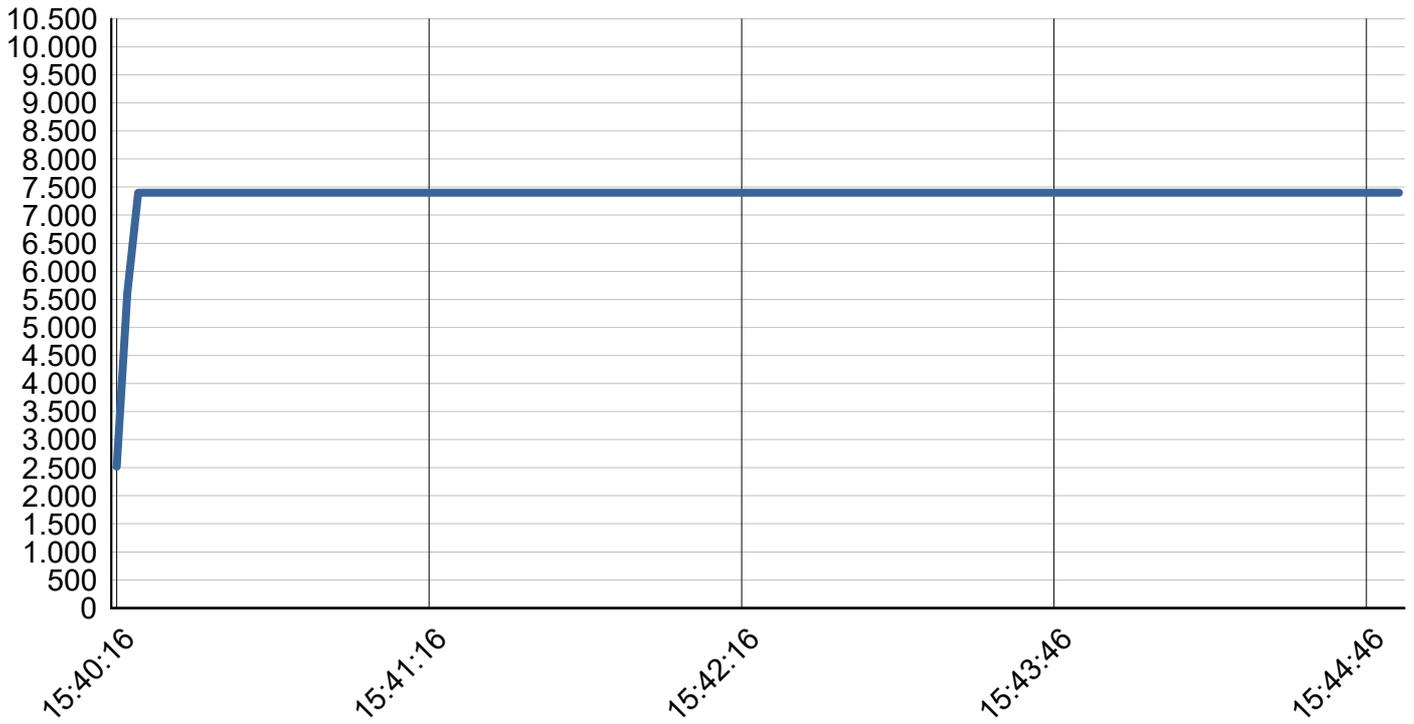

**DEFECTOS**

Deformaciones	N
Desgaste Localizado	N
Rotura Alma	N
Rotura Alambre	N
Corrosión	N

**TERMINA OJAL**

Emplomado	S
Encasquillado	N

**TERRENO**

Desnivel Pronunciado	N
Anclaje Inaccesible	N
Drenaje Fluidos	N

**Observaciones:**

HOMOLOGADO



ANTES



DESPUES




INFORME DE VERIFICACIÓN DE ANCLAJES

Cód: 65

Fecha de Emisión: 30/06/2022

Nº Anclaje	Orientación	Zona	Dist. Boca de Pozo	Long Inicial	Long Final	Resultado	Tipo
2	NE	D	27,00	0,25	35,00	Apto	PRUEBA

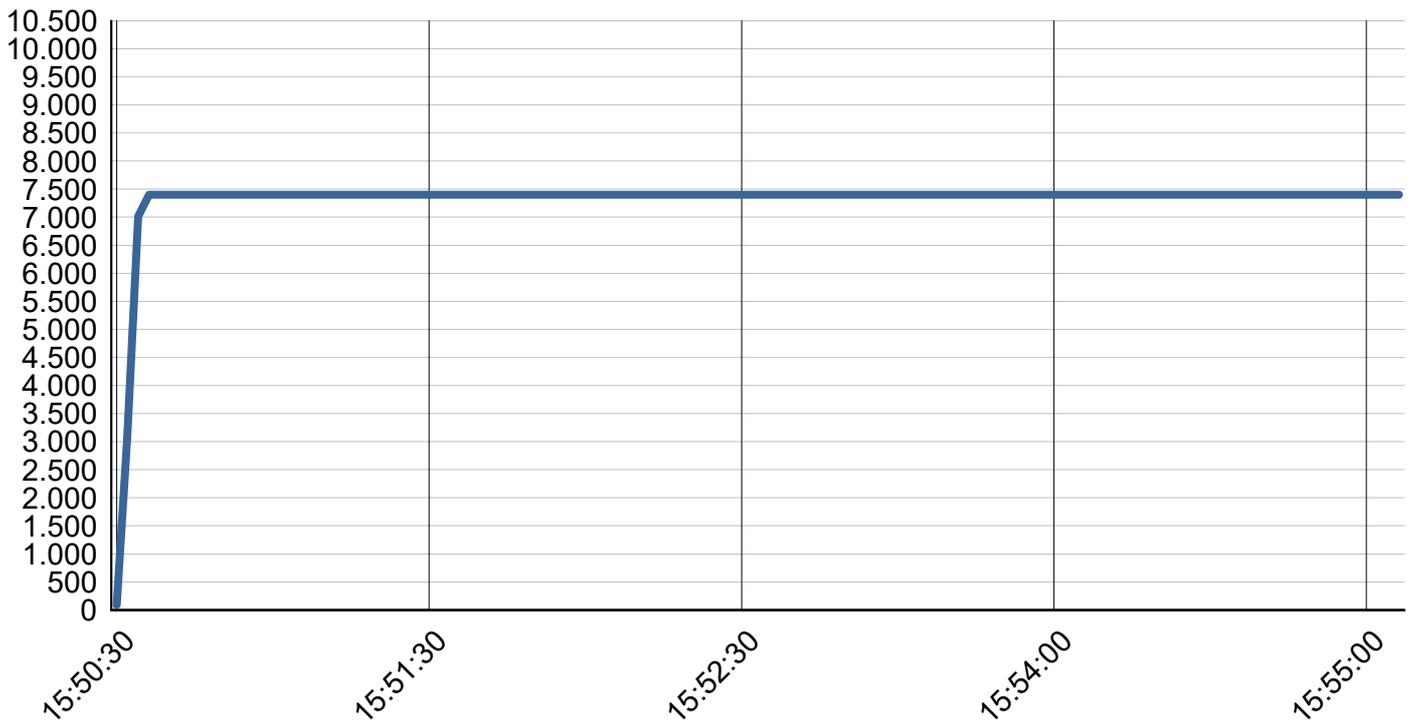

**DEFECTOS**

Deformaciones	N
Desgaste Localizado	N
Rotura Alma	N
Rotura Alambre	N
Corrosión	N

**TERMINA OJAL**

Emplomado	S
Encasquillado	N

**TERRENO**

Desnivel Pronunciado	N
Anclaje Inaccesible	N
Drenaje Fluidos	N

**Observaciones:**

HOMOLOGADO



ANTES



DESPUES




INFORME DE VERIFICACIÓN DE ANCLAJES

Cód: 65

Fecha de Emisión: 30/06/2022

Nº Anclaje	Orientación	Zona	Dist. Boca de Pozo	Long Inicial	Long Final	Resultado	Tipo
3	SE	D	27,00	25,00	35,00		PRUEBA

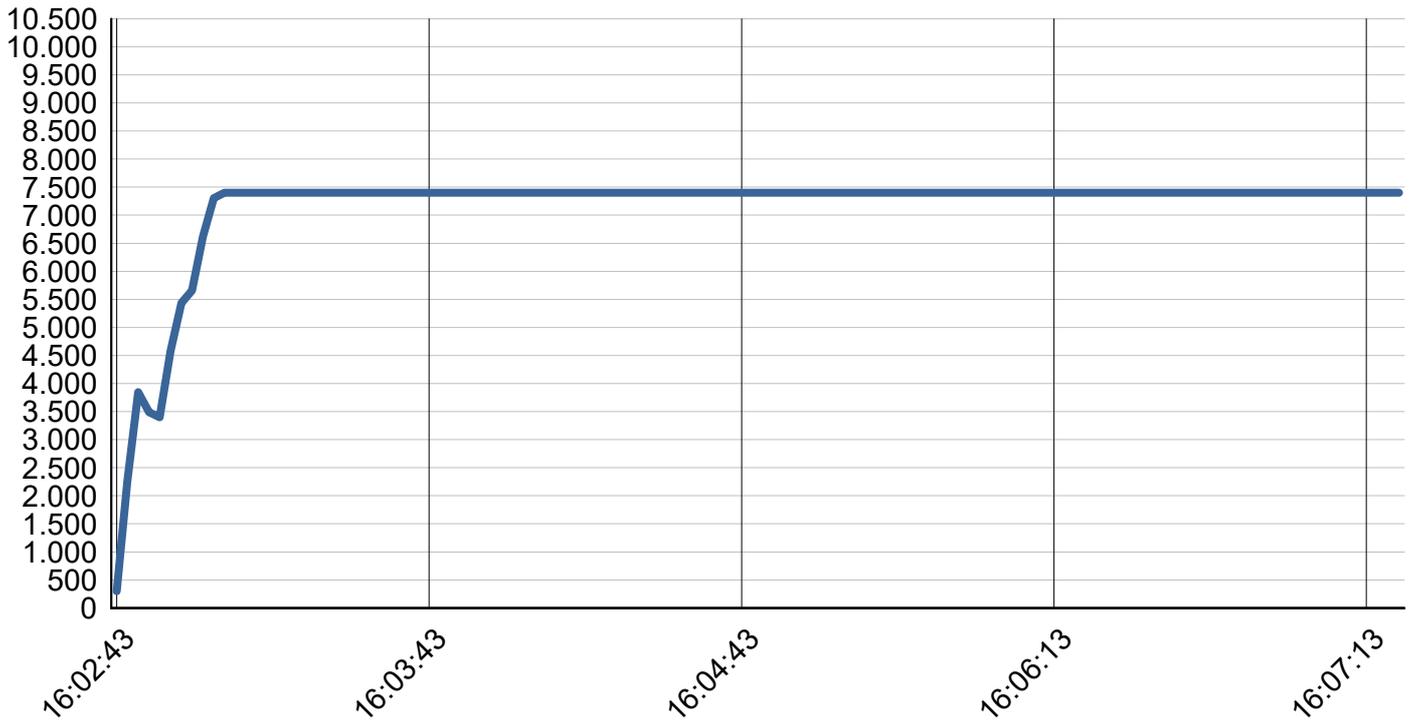

**DEFECTOS**

Deformaciones	N
Desgaste Localizado	N
Rotura Alma	N
Rotura Alambre	N
Corrosión	N

**TERMINA OJAL**

Emplomado	N
Encasquillado	S

**TERRENO**

Desnivel Pronunciado	N
Anclaje Inaccesible	N
Drenaje Fluidos	N

**Observaciones:**

ANCLAJE AEREO/HOMOLOGADO



ANTES



DESPUÉS




INFORME DE VERIFICACIÓN DE ANCLAJES

Cód: 65

Fecha de Emisión: 30/06/2022

Nº Anclaje	Orientación	Zona	Dist. Boca de Pozo	Long Inicial	Long Final	Resultado	Tipo
4	SO	D	27,00	25,00	35,00	Apto	PRUEBA

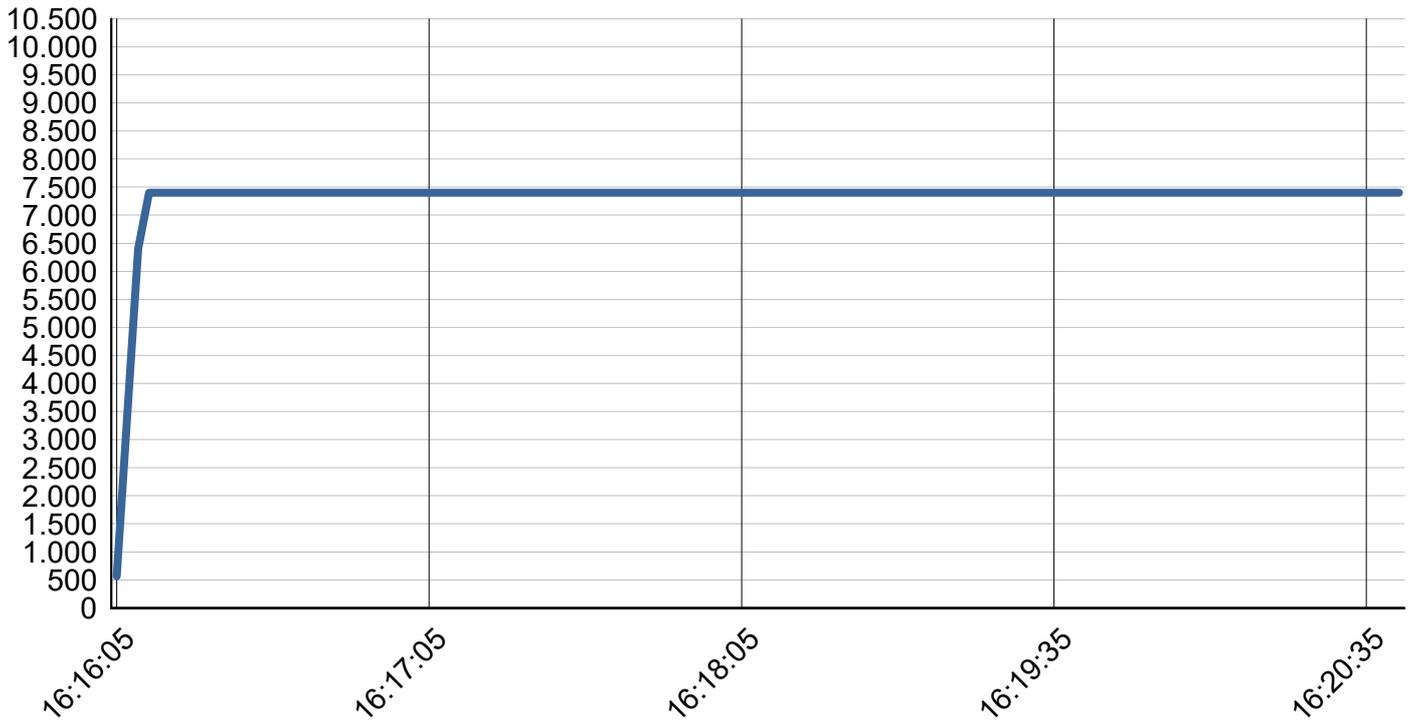

**DEFECTOS**

Deformaciones	N
Desgaste Localizado	N
Rotura Alma	N
Rotura Alambre	N
Corrosión	N

**TERMINA OJAL**

Emplomado	S
Encasquillado	N

**TERRENO**

Desnivel Pronunciado	N
Anclaje Inaccesible	N
Drenaje Fluidos	N

**Observaciones:**

HOMOLOGADO



ANTES



DESPUÉS



INFORME DE VERIFICACIÓN DE ANCLAJES

Cód: 65

Fecha de Emisión: 30/06/2022

N° Anclaje	Orientación	Zona	Dist. Boca de Pozo	Long Inicial	Long Final	Resultado	Tipo
5							

#### DEFECTOS

Deformaciones

Desgaste Localizado

Rotura Alma

Rotura Alambre

Corrosión

#### TERMINA OJAL

Emplomado

Encasquillado

#### TERRENO

Desnivel Pronunciado

Anclaje Inaccesible

Drenaje Fluidos

#### Observaciones:

NO SE ENCUENTRA CONTRUIDO ANCLAJE NUMERO  
5 (S)



ANTES
