




INFORME DE VERIFICACIÓN DE ANCLAJES

Cód: 245

Fecha de Emisión: 19/04/2022

ÁREA PRODUCCIÓN	SEÑAL PICADA
POZO	SP-305
LATITUD	
LONGITUD	
TENSIÓN MAX APLICADA	7.400,00
TENSIÓN DE REFERENCIA	SEGUN NORMA API RP4G
ANCLAJES VERIFICAODOS	4
FECHA	19/04/2022
HORA	15:48:31
INTERNO	
PATRÓN	
MARCA	
MODELO	
Nº SERIE	
CERT CALIBRACIÓN	
FECHA VTO CAL	

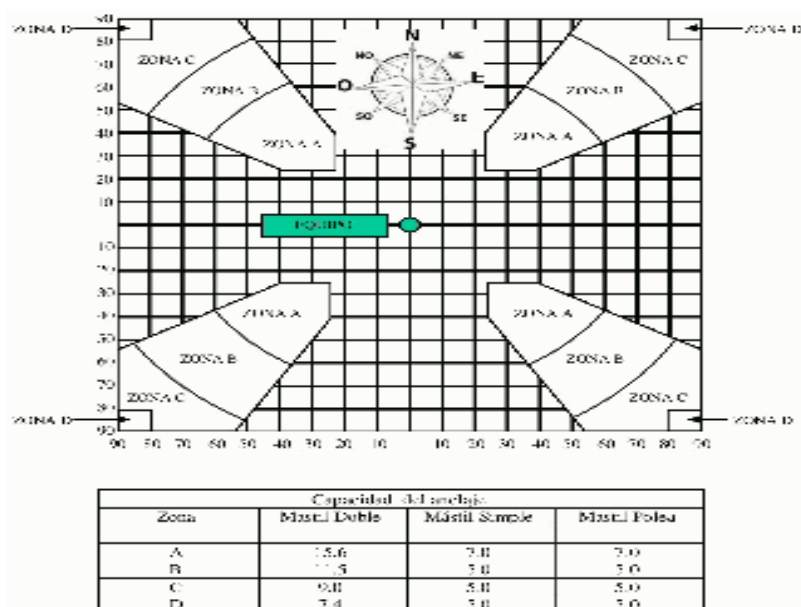

Personal Interviniente

Yordan, Kevin	Olave, Mikhail
---------------	----------------

Yordan

Olave

Firma Operario

Firma Operario



INFORME DE VERIFICACIÓN DE ANCLAJES

Cód: 245

Fecha de Emisión: 19/04/2022

Nº Anclaje	Orientación	Zona	Dist. Boca de Pozo	Long Inicial	Long Final	Resultado	Tipo
1	NO	D	27,00	25,00	35,00	Apto	PRUEBA



DEFECTOS

Deformaciones	N
Desgaste Localizado	S
Rotura Alma	N
Rotura Alambre	N
Corrosión	S

TERMINA OJAL

Emplomado	N
Encasquillado	N

TERRENO

Desnivel Pronunciado	N
Anclaje Inaccesible	N
Drenaje Fluidos	N

Observaciones:

NO HOMOLOGADO



ANTES



DESPUÉS



INFORME DE VERIFICACIÓN DE ANCLAJES

Cód: 245

Fecha de Emisión: 19/04/2022

Nº Anclaje	Orientación	Zona	Dist. Boca de Pozo	Long Inicial	Long Final	Resultado	Tipo
2	NE	D	27,00	25,00	35,00	Apto	PRUEBA



DEFECTOS

Deformaciones	N
Desgaste Localizado	S
Rotura Alma	N
Rotura Alambre	N
Corrosión	S

TERMINA OJAL

Emplomado	N
Encasquillado	N

TERRENO

Desnivel Pronunciado	N
Anclaje Inaccesible	N
Drenaje Fluidos	N

Observaciones:

NO HOMOLOGADO



ANTES



DESPUÉS



INFORME DE VERIFICACIÓN DE ANCLAJES

Cód: 245

Fecha de Emisión: 19/04/2022

Nº Anclaje	Orientación	Zona	Dist. Boca de Pozo	Long Inicial	Long Final	Resultado	Tipo
3	SE	D	27,00	25,00	35,00	Apto	PRUEBA



DEFECTOS

Deformaciones	N
Desgaste Localizado	N
Rotura Alma	N
Rotura Alambre	N
Corrosión	S

TERMINA OJAL

Emplomado	N
Encasquillado	S

TERRENO

Desnivel Pronunciado	N
Anclaje Inaccesible	N
Drenaje Fluidos	N

Observaciones:

HOMOLOGADO



ANTES



DESPUÉS



INFORME DE VERIFICACIÓN DE ANCLAJES

Cód: 245

Fecha de Emisión: 19/04/2022

Nº Anclaje	Orientación	Zona	Dist. Boca de Pozo	Long Inicial	Long Final	Resultado	Tipo
4	SO	D	27,00	25,00	35,00	Apto	PRUEBA



DEFECTOS

Deformaciones	N
Desgaste Localizado	S
Rotura Alma	N
Rotura Alambre	N
Corrosión	S

TERMINA OJAL

Emplomado	N
Encasquillado	N

TERRENO

Desnivel Pronunciado	N
Anclaje Inaccesible	N
Drenaje Fluidos	N

Observaciones:

NO HOMOLOGADO



ANTES



DESPUÉS
