

**INFORME DE VERIFICACIÓN DE ANCLAJES**

Cód:

118

Fecha de Emisión: 13/04/2022

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| ÁREA PRODUCCIÓN       | SEÑAL PICADA           |
| POZO                  | SP-461                 |
| LATITUD               |                        |
| LONGITUD              |                        |
| TENSIÓN MAX APLICADA  | 7.400,00               |
| TENSIÓN DE REFERENCIA | SEGUN NORMAS API RP 4G |
| ANCLAJES VERIFICAODOS | 4                      |
| FECHA                 | 12/04/2022             |
| HORA                  | 14:55:58               |
| INTERNO               |                        |
| PATRÓN                |                        |
| MARCA                 |                        |
| MODELO                |                        |
| Nº SERIE              |                        |
| CERT CALIBRACIÓN      |                        |
| FECHA VTO CAL         |                        |

**Personal Interviniente**

|                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| MOYANO, MARCELO | ESPINOLA, ALDO FEDERICO |
|-----------------|-------------------------|

Firma Operario

Firma Operario




# INFORME DE VERIFICACIÓN DE ANCLAJES

Cód: 118

Fecha de Emisión: 13/04/2022

| Nº Anclaje | Orientación | Zona | Dist. Boca de Pozo | Long Inicial | Long Final | Resultado | Tipo   |
|------------|-------------|------|--------------------|--------------|------------|-----------|--------|
| 1          | NO          | D    | 27,00              | 25,00        | 35,00      | Apto      | PRUEBA |

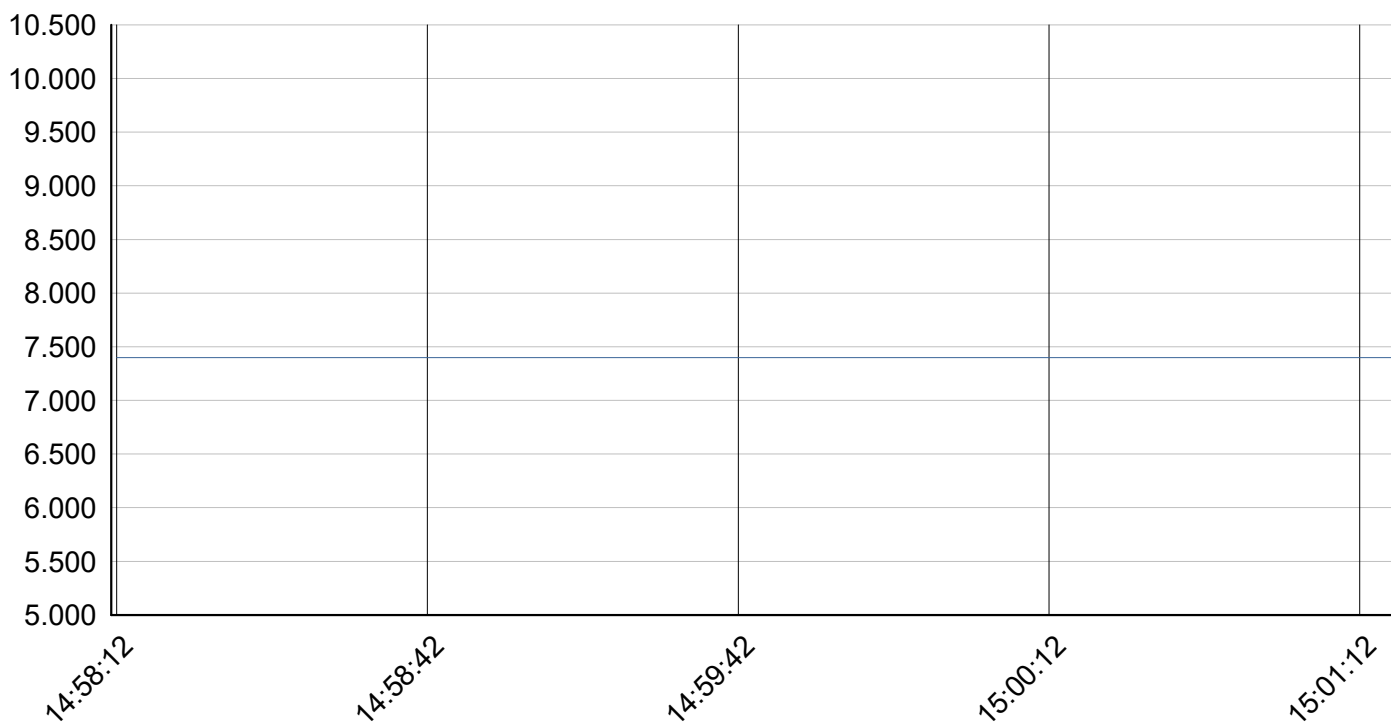

## DEFECTOS

|                     |   |
|---------------------|---|
| Deformaciones       | N |
| Desgaste Localizado | S |
| Rotura Alma         | N |
| Rotura Alambre      | N |
| Corrosión           | S |

## TERMINA OJAL

|               |   |
|---------------|---|
| Emplomado     | N |
| Encasquillado | N |

## TERRENO

|                      |   |
|----------------------|---|
| Desnivel Pronunciado | N |
| Anclaje Inaccesible  | N |
| Drenaje Fluidos      | N |

## Observaciones:

NO HOMOLOGADO



ANTES



DESPUÉS






# INFORME DE VERIFICACIÓN DE ANCLAJES

Cód: 118

Fecha de Emisión: 13/04/2022

| Nº Anclaje | Orientación | Zona | Dist. Boca de Pozo | Long Inicial | Long Final | Resultado | Tipo   |
|------------|-------------|------|--------------------|--------------|------------|-----------|--------|
| 2          | NE          | D    | 27,00              | 25,00        | 35,00      | Apto      | PRUEBA |

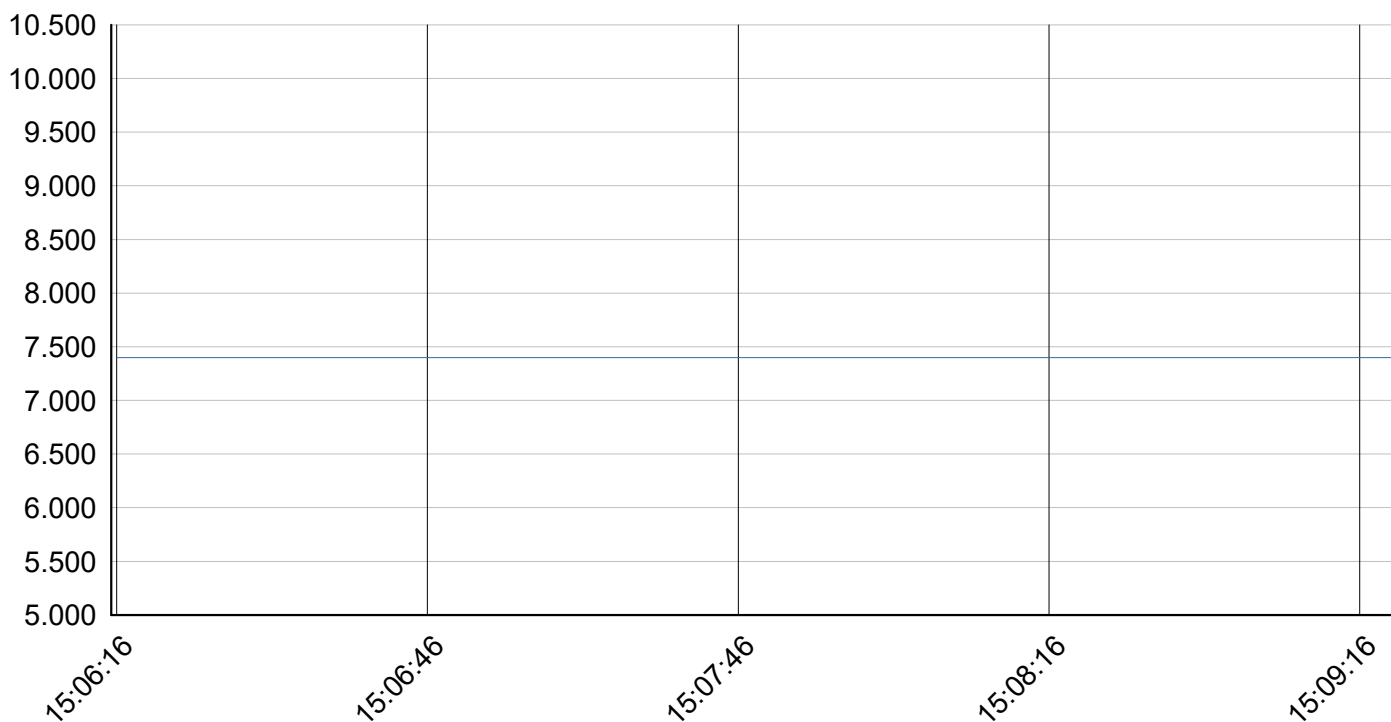

## DEFECTOS

|                     |   |
|---------------------|---|
| Deformaciones       | N |
| Desgaste Localizado | S |
| Rotura Alma         | N |
| Rotura Alambre      | N |
| Corrosión           | S |

## TERMINA OJAL


|               |   |
|---------------|---|
| Emplomado     | N |
| Encasquillado | N |

## TERRENO

|                      |   |
|----------------------|---|
| Desnivel Pronunciado | N |
| Anclaje Inaccesible  | N |
| Drenaje Fluidos      | N |

## Observaciones:

NO HOMOLOGADO

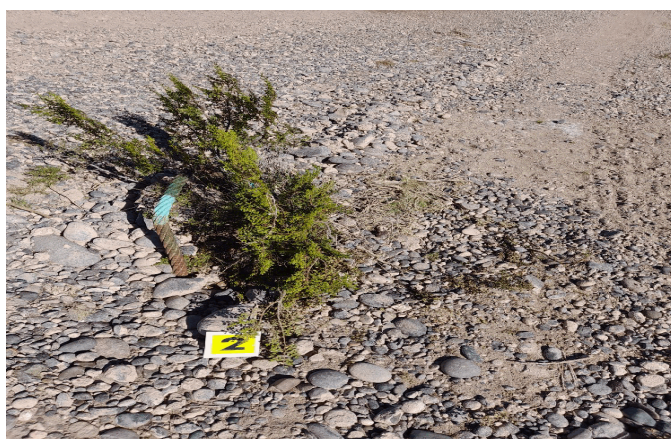

ANTES



DESPUÉS



# INFORME DE VERIFICACIÓN DE ANCLAJES

Cód: 118

Fecha de Emisión: 13/04/2022

| Nº Anclaje | Orientación | Zona | Dist. Boca de Pozo | Long Inicial | Long Final | Resultado | Tipo   |
|------------|-------------|------|--------------------|--------------|------------|-----------|--------|
| 3          | SE          | D    | 27,00              | 25,00        | 35,00      | Apto      | PRUEBA |



## DEFECTOS

|                     |   |
|---------------------|---|
| Deformaciones       | N |
| Desgaste Localizado | N |
| Rotura Alma         | N |
| Rotura Alambre      | N |
| Corrosión           | S |

## TERMINA OJAL

|               |   |
|---------------|---|
| Emplomado     | N |
| Encasquillado | S |

## TERRENO

|                      |   |
|----------------------|---|
| Desnivel Pronunciado | N |
| Anclaje Inacceible   | N |
| Drenaje Fluidos      | N |

## Observaciones:

HOMOLOGADO



ANTES



DESPUÉS






# INFORME DE VERIFICACIÓN DE ANCLAJES

Cód: 118

Fecha de Emisión: 13/04/2022

| Nº Anclaje | Orientación | Zona | Dist. Boca de Pozo | Long Inicial | Long Final | Resultado | Tipo   |
|------------|-------------|------|--------------------|--------------|------------|-----------|--------|
| 4          | SO          | D    | 27,00              | 25,00        | 35,00      | Apto      | PRUEBA |

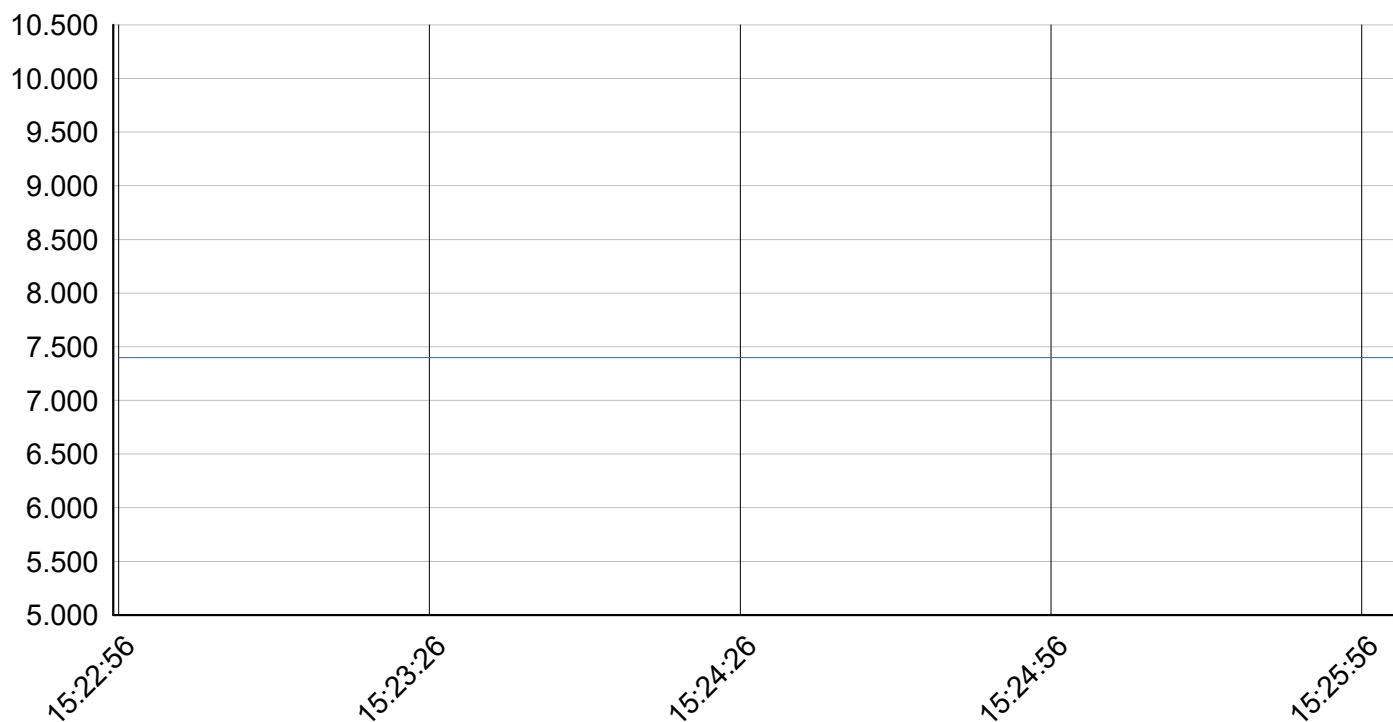

## DEFECTOS

|                     |   |
|---------------------|---|
| Deformaciones       | N |
| Desgaste Localizado | S |
| Rotura Alma         | N |
| Rotura Alambre      | N |
| Corrosión           | S |

## TERMINA OJAL

|               |   |
|---------------|---|
| Emplomado     | N |
| Encasquillado | N |

## TERRENO

|                      |   |
|----------------------|---|
| Desnivel Pronunciado | N |
| Anclaje Inaccesible  | N |
| Drenaje Fluidos      | N |

## Observaciones:

NO HOMOLOGADO



ANTES



DESPUÉS
